



GEMEENTE TILBURG



Waterschap

Brabantse Delta

17.ZK01675/18.B0152
17UT002527

Samenwerkingsovereenkomst voorbereiding en uitvoering:

- **Beekherstel en EVZ Oude Leij,**
- **EVZ De Groote Leij,**
- **EVZ Hultensche Leij,**
- **Reeshofweide en Lange Rekken.**

Partijen

Waterschap Brabantse Delta

Gevestigd te Breda, kantoorhoudende aan de Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda, correspondentieadres: Postbus 5520, 4801 DZ Breda, vertegenwoordigd door haar portefeuillehouder [redacted] handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, d.d. 26 juni 2017, verder te noemen "waterschap"

en

Gemeente Tilburg

Gevestigd te Tilburg, kantoorhoudend aan het Stadhuisplein 128 5038 TC Tilburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door [redacted], daartoe gemachtigd door collegebesluit d.d. 2 juli 2018, hierna te noemen "de gemeente Tilburg".

Gezamenlijk te noemen, "partijen",

Overwegende dat:

- a. in het door de Provinciale Staten op 18 december 2015 vastgestelde Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 (PMWP) langs de Groote Leij, de Hultensche Leij en de Oude Leij (gedeeltelijk) de waterhuishoudkundige functie "ecologische verbindingsszone met wateropgave" (EVZ) is toegekend en dat langs de Oude Leij bovendien de functie "verweven" is toegekend ;
- b. in het waterbeheerplan van waterschap Brabantse Delta, deze functies zijn overgenomen;



- c. in het provinciale beleid is aangegeven dat de realisering van EVZ's door gezamenlijke inspanning van waterschappen en gemeenten dient plaats te vinden, waarbij ook de inzet van andere partijen tot de mogelijkheden behoort;
- d. de provincie Noord-Brabant, hierna te noemen Provincie, als uitgangspunt hanteert dat een EVZ in het buitengebied een gemiddelde breedte heeft van circa 25 meter (of 2½ ha per strekkende km in de vorm van stapstenen) en dat in het stedelijk gebied een EVZ een gemiddelde breedte heeft van circa 50 meter;
- e. op basis van het provinciale beleid de waterbeheerder verantwoordelijk is voor realisatie en het onderhoud van het 10 meter deel van de EVZ, direct grenzend aan de waterkant; de gemeente is verantwoordelijk voor realisatie en het onderhoud van het overige deel van de EVZ.
- f. de voorbereiding en uitvoering van beekherstel, voortkomend uit de functie "verweven" en vanuit de Kader Richtlijn Water opgave, gelijktijdig zal plaatsvinden met de voorbereiding en uitvoering van EVZ's. De kosten van de uitvoering van het beekherstel zijn voor 100% voor rekening van het waterschap;
- g. partijen in november 2016 een intentieverklaring hebben ondertekend over het gezamenlijk realiseren van de EVZ-opgave langs de Groote Leij, Hultensche Leij en Oude Leij en over het beekherstel van de Oude Leij;
- h. het realiseren en beheren van de EVZ en het beekherstel vanuit ecologie van essentieel belang is om het toekomstige Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) te laten functioneren;
- i. bij de inrichting van de EVZ en beekherstel tevens de volgende algemene uitgangspunten gelden: het creëren van waterberging, het herstel van de cultuurhistorische waarden, het verhogen van de recreatieve waarde, het versterken van de landschappelijke kwaliteit en verruiming van de mogelijkheden voor natuureducatie;
- j. partijen gezamenlijk streven naar een zo groot mogelijke dekking van de projectkosten door bijdragen van derden (subsidies); Hiertoe is reeds een subsidie verleend door het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant en een subsidieaanvraag POP3 door de gemeente ingediend bij de provincie;
- k. de gemeente de projectleiding op zich neemt;
- l. ontwikkelaar "GEM Koolhoven" verantwoordelijk is voor de realisatie van de EVZ langs de Oude Leij, tussen de spoorlijn en de Bredaseweg en dat de gemeente gemachtigd is om op te treden voor GEM Koolhoven;
- m. partijen hun afspraken over hun onderlinge samenwerking bij de voorbereiding en uitvoering van de EVZ en het beekherstel schriftelijk vastleggen in onderhavige overeenkomst.



Komen het navolgende overeen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

- 1.1 *Natte Ecologische Verbindingszone, hierna te noemen EVZ*
De als zodanig in de Verordening Ruimte en het PMWP van de provincie Noord-Brabant opgenomen EVZ. Het betreft "natte" lijnvormige verbindingsstroken en/of stapstenen bedoeld om natuurgebieden met elkaar te verbinden en zodoende de verplaatsing van flora en fauna te bevorderen.
- 1.2 *Beekherstel*
Beekherstel is gericht op het realiseren van de KRW-opgave en voorziet in een robuuste, dynamische en natuurlijkere staat, o.a. gericht op vismigratie vanuit het hoofdsysteem (grote rivieren)
- 1.3 *Projectgroep*
Een organisatie, onder leiding van de gemeente Tilburg, bestaande uit medewerkers van gemeente Tilburg en waterschap met als taak het voorbereiden en laten uitvoeren van het beekherstel en EVZ-realisatie, zoals omschreven in artikel 3.
- 1.4 *Opdrachtgever*
De gemeente die op basis van deze overeenkomst opdrachten geeft over de voorbereiding en de uitvoering trekt.
- 1.5 *Projectplan*
Het door het waterschap, in haar hoedanigheid van waterbeheerder, op grond van artikel 5.4 van de Waterwet op te stellen projectplan voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk d.w.z. werkzaamheden die zorgen voor een wijziging van de ligging, vorm, afmeting of constructie daarvan.
- 1.6 *Beheer- en onderhoudsplan*
Een, in overleg tussen partijen overeen te komen, document waarin de wijze van beheer en onderhoud van de hele EVZ inclusief beekherstel en de verdeling van de kosten ervan is uitgewerkt. Het beheer- en onderhoudsplan dient als basis voor het apart overeen te komen onderhoudscontract tussen partijen.
- 1.7 *Europese Kader Richtlijn Water (KRW) opgave*
Deze richtlijn bepaalt dat de wateren een goed leefgebied vormen voor de planten en dieren die er thuishoren

Artikel 2 Doelstelling van de samenwerking

- 2.1 Deze samenwerkingsovereenkomst is, gericht op het:
- vastleggen van de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de voorbereiding zal plaatsvinden
 - vastleggen van de financiële uitgangspunten
- 
- 

- vastleggen van de uitgangspunten voor het sluiten van het in artikel 1.6 bedoelde onderhoudscontract;
- 2.2 De basis voor de realisering van de herinrichting zijn meerdere door het waterschap vast te stellen projectplannen Waterwet zoals bedoeld in artikel 1.5.
- 2.3 Deze overeenkomst gaat in hoofdlijnen over de volgende onderwerpen (zie ook artikelen hierna):
- (doen) opstellen van meerdere projectplannen voor de verschillende (deel)projecten en van de bijbehorende beheer- en onderhoudsplannen;
 - de zorg voor het verkrijgen van alle benodigde toestemmingen en vergunningen;
 - planologisch formaliseren van het gerealiseerde tracé van de EVZ;
 - maken van afspraken over de kostenverdeling;
 - De volgende onderwerpen dienen in elk geval door de projectgroep voorbereid en uitgevoerd te worden:
 - (doen) uitvoeren van benodigd onderzoek zoals inventarisatie van belemmeringen, kabels en leidingen, bodemkwaliteit, flora- en faunaonderzoek, archeologie, cultuurhistorie, niet gesprongen explosieven etc.;
 - communicatie en afstemming met belanghebbenden zoals aanwonenden, aanliggende bedrijven, klankbord- en belangengroepen, nutsbedrijven etc.;
 - (doen) opstellen van de aanbestedingsdocumenten voor de voorbereiding (en uitvoering) van de inrichting van het plangebied en het houden van de aanbesteding;
 - opstellen van een planning van werkzaamheden;
 - opstellen van een overzicht van inkomsten en uitgaven met financieringsbronnen;
 - aanvragen subsidies.


Artikel 3 Omschrijving van de natte EVZ's en het beekherstel waarop deze overeenkomst van toepassing is.

Deze overeenkomst is van toepassing op de voorbereiding en uitvoering van de inrichting van de volgende deelgebieden:

- a) Bosperceel 1,84 km beekherstel
- b) Gilzerbaan 1,21 km beekherstel
- c) Bredaseweg 0,90 km beekherstel en 0,9 km EVZ
- d) Koolhoven 1,03 km beekherstel
- e) Reeshofweide 1,27 km beekherstel en 1,27 km EVZ
- f) Groote Leij 1,3 km EVZ



g) Hultensche Leij 2,91 km EVZ

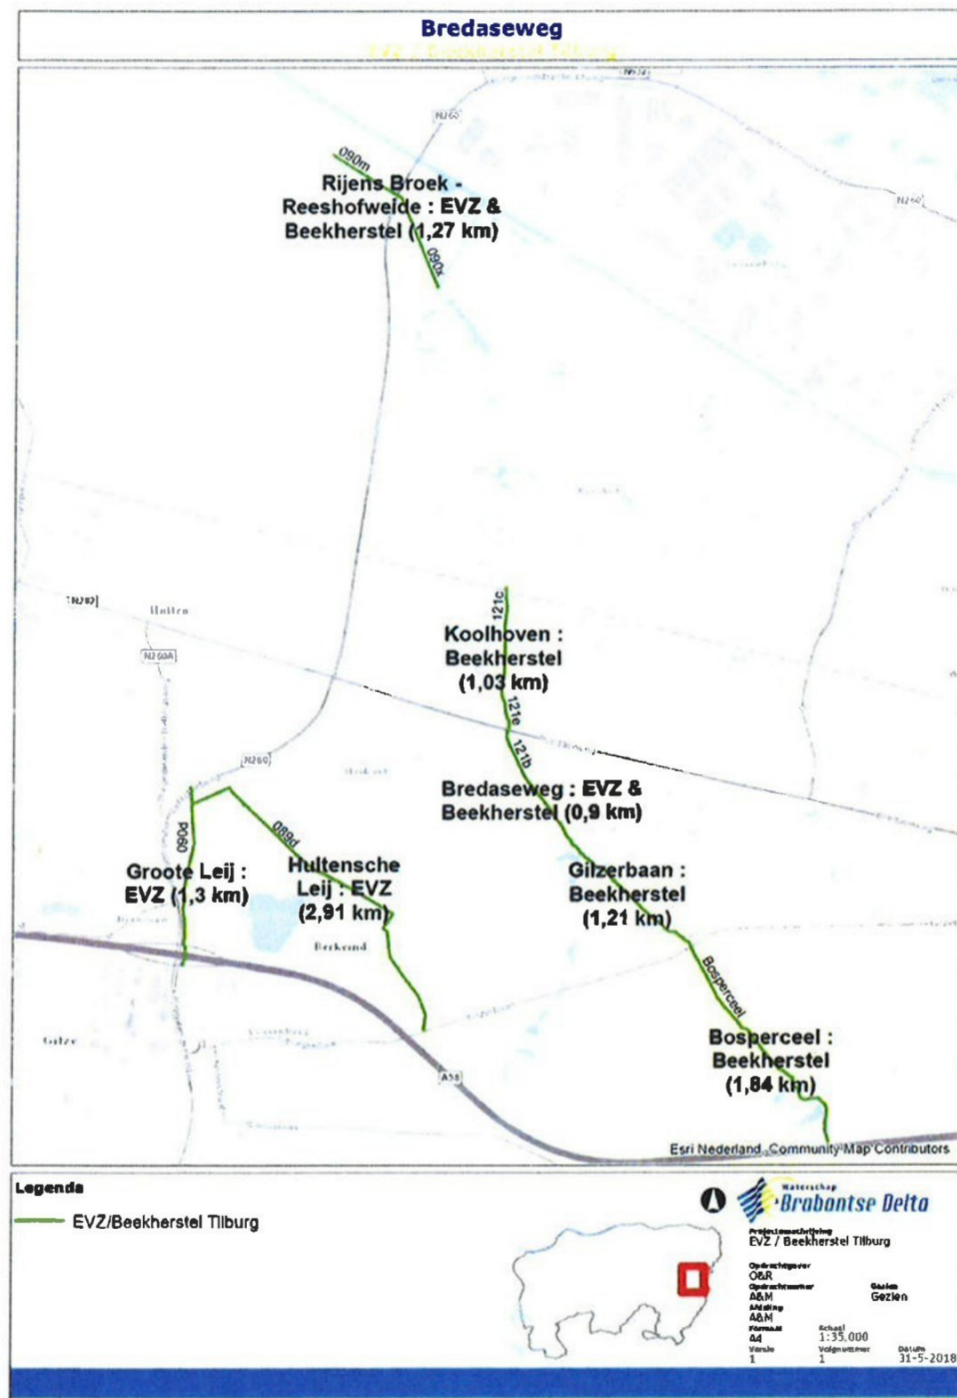

Overzichtskaart van verschillende deelgebieden

Artikel 4 Wijze van samenwerking tussen partijen en projectorganisatie

- 4.1 Om aan de samenwerking m.b.t. de EVZ's en het beekherstel uitvoering te geven zal een projectgroep bestaande uit ambtelijke medewerkers van beide partijen en een Stuurgroep bestaande uit de reguliere bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente en het waterschap worden samengesteld. De projectgroep zal de voorbereiding en de uitvoering van de inrichting van dit deel van de EVZ en het beekherstel ter hand nemen.
- 4.2 Partijen verplichten zich om zich binnen de grenzen van de redelijkheid en billijkheid in te spannen om de doelstelling van de overeenkomst te realiseren, ook als subsidiebeschikkingen niet worden toegekend.
- 4.3 Partijen verplichten zich om, indien door welke oorzaak dan ook, vertraging ontstaat of dreigt in de uitvoering van hun samenwerking onverwijld met elkaar in overleg te treden en zich in te spannen de vertraging op te heffen zodat het doel van deze overeenkomst kan worden gehaald.
- 4.4 De door de gemeente aan te wijzen projectleider van de gemeente zal, namens de projectgroep, verantwoording over de uitvoering van de overeenkomst afleggen in het bestuurlijk overleg tussen waterschap en gemeente middels een periodieke rapportage (2 keer per jaar).
- 4.5 Bij het verlenen van opdrachten zal de gemeente rekening houden met de subsidievoorwaarden en haar aanbestedingsbeleid in acht nemen.
- 4.6 In het ambtelijk overleg tussen de gemeente en het waterschap zal per kwartaal de voortgang op basis besproken worden aan de hand van de uitgaven en behaalde resultaten in dat kwartaal.
- 4.7 Per uit te voeren traject zoals benoemd in artikel 3 zal voor uitvoering een realisatieovereenkomst (ROK) tussen gemeente en waterschap worden opgesteld.

Artikel 5 Taken en verantwoordelijkheden van het waterschap

- 5.1 Het waterschap is verantwoordelijk voor de eerste 10 meter van de EVZ; dit komt in het landelijk gebied neer op 40% van de kosten van de realisatie en van het beheer en onderhoud van de EVZ. Het waterschap is volledig verantwoordelijk voor het beekherstel zowel voorbereiding als realisatie, als ook voor het beheer en onderhoud.
- 5.2 Het waterschap spant zich in om, behoudens voor zover wettelijke procedures zich daartegen verzetten, alle benodigde ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen en andere toestemmingen te verlenen die benodigd zijn om de EVZ en het beekherstel te kunnen realiseren.
- 5.3 Het waterschap levert input voor het projectplan en is verantwoordelijk voor de bestuurlijke vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschap. Het waterschap begeleidt deze bestuurlijke route waaronder de inspraakperiode en behandeling van eventuele zienswijzen.
- 5.4 Het waterschap voert voor het project de volgende activiteiten uit:
vaststellen van het projectplan zoals bedoeld in art. 1.5 en 5.3;

- inbreng van expertise t.b.v. de totstandkoming van het projectplan
- financieel bijdragen als co-financier van de EVZ conform art. 5.1

5.5 Het waterschap heeft een toetsende rol met betrekking tot het voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, concept projectplan en beheer-onderhoudsplan. Tevens zal het waterschap het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp in haar rol als projectteamlid mede vaststellen.

Artikel 6 Taken en verantwoordelijkheden van de gemeente Tilburg

6.1 De gemeente is opdrachtgever en levert de projectleider.

6.2 De gemeente is verantwoordelijk voor 60% van de kosten van de realisatie en van het beheer en onderhoud van de EVZ.

6.3 De gemeente spant zich in om, behoudens voor zover wettelijke procedures zich daartegen verzetten, alle benodigde ontheffingen, vrijstellingen, goedkeuringen en andere toestemmingen te verlenen die nodig zijn om de EVZ en het beekherstel te realiseren en om de als EVZ in te richten gebieden als duurzame natuur te bestemmen.

6.4 Bij de inrichting van de EVZ kan de gemeente indien juridisch mogelijk en planologisch door haar gewenst invulling geven aan extensief recreatief medegebruik. Het waterschap zal de "beleidsnota recreatief medegebruik" d.d. 31 augustus 2011, als uitgangspunt hanteren als burgers, bedrijven en andere belanghebbenden het waterschap vragen om medewerking voor dit gebruik.

6.5 De gemeente zal aan de provincie een verzoek doen tot formalisering van het gerealiseerde tracé in het provinciale beleid.

6.6 De gemeente verworft gronden welke zijn benodigd voor de EVZ en blijft grondeigenaar.

Artikel 7 Als EVZ in te richten grond

7.1 Partijen hebben op basis van het projectplan nader overleg over de wijze waarop de inrichting van de gronden wordt uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat er een EVZ gerealiseerd wordt die ook daadwerkelijk als zodanig kan functioneren. Dit betekent dat van de gemiddelde breedte van 25 meter, zoals die doorgaans gehanteerd wordt, afgeweken kan worden.

7.2 Eigenaren van grond die grond inbrengen kunnen eigenaar blijven van de ingebrachte gronden.

Artikel 8 Aanleg en inrichting op basis van projectplannen.

8.1 Voor de in te richten gronden worden, met inachtneming van artikel 5.3, iedere, projectplan(nen) Waterwet vastgesteld. Het projectplan betreft een nadere detaillering van (een deel) van een EVZ en beekherstel en is onderdeel van een inrichtingsplan en basis voor

de daadwerkelijke uitvoering.

- 8.2 In overeenstemming met de Inspraakverordening van het waterschap wordt het projectplan in de inspraakprocedure gebracht om uiteindelijk door het algemene bestuur van het waterschap vastgesteld te worden.
- 8.3 De inspanningen van beide partijen zijn erop gericht dat de uitvoering van de inrichting van EVZ's en het beekherstel gereed is binnen de gestelde termijnen in de subsidievoorwaarden van GOB en POP3.
- 8.4 Indien een van de of beide partijen vaststellen dat deze data niet worden gehaald, zijn ze verplicht om onverwijld met elkaar afspraken te maken over de technische, financiële en juridische voorwaarden waaronder de uitvoering wordt voortgezet o.a. over een datum van oplevering.

Artikel 9 Beheer en onderhoud

9.1 Beheer- en onderhoudsplan.

Het beheer en onderhoud van de EVZ en het beekherstel wordt uitgevoerd conform een beheer- en onderhoudsplan zoals bedoeld in artikel 1.6 dat in overleg tussen partijen wordt vastgesteld met inachtneming van de kostenverdeling zoals genoemd in artikel 9.2.

9.2 Kostenverdeling beheer en onderhoud

Het waterschap is verantwoordelijk voor 40% van de kosten van het beheer en onderhoud van de EVZ en 100% voor beheer en onderhoud van beekherstel en de gemeente is verantwoordelijk voor 60% van de kosten van EVZ beheer en onderhoud.

Artikel 10 Verdeling van kosten voor planvoorbereiding en uitvoering.

10.1 Ten aanzien van de verdeling van de kosten voor de grondafwaardering, het aankopen van de grond, planvoorbereiding en uitvoering (inrichting) zijn partijen de volgende verdeelsleutel overeengekomen:

Voor wat betreft de kostenposten die betrekking hebben op EVZ:

- Het waterschap is verantwoordelijk voor 40% van deze kostenposten.
- De gemeente is verantwoordelijk voor 60% van deze kosten.

Voor wat betreft de kostenposten die betrekking hebben op beekherstel:

- Het waterschap is verantwoordelijk voor 100% van deze kosten.

10.2 Deze kostenverdeling van lid 1 geldt ook voor de kosten voor noodzakelijke onderzoeken, communicatie, bestemmingsplanwijzigingen, vergunningen, directievoering en toezicht, etc.

10.3 De overige eigen interne ambtelijke kosten die zijn gemoeid met de uitvoering van het gezamenlijke doel voor de ecologische inrichting van de waterlopen worden door iedere partij zelf gedragen in dit project.

De gemeente aan het waterschap (en vice versa) in rekening te brengen kosten worden door de gemeente in een of twee termijnen

gefactureerd (inclusief kopie facturen en betaalbewijzen) aan het waterschap. Het waterschap dient die factu(u)r(en) binnen 1 maand te betalen.

- 10.5 Deze verrekening en facturering van kosten vindt plaats op basis van nacalculatie.
- 10.6 De gemeenten en het waterschap stellen benodigde middelen beschikbaar op basis van de in artikelen 5.1, 6.2, 10.1 en 10.2 verdeelsleutels en gaan voor wat betreft de middelen voor grondverwerving, planvoorbereiding én inrichting daarbij vooralsnog uit van de begroting zoals die door partijen opgesteld is in het kader van de GOB subsidieaanvraag van februari 2016 (bijlage 2) en de begroting t.b.v. POP3 van december 2017 (bijlage 1). De hier toegepaste verdeelsleutels blijven ook gelden indien op basis van voortschrijdend inzicht deze begroting geactualiseerd dient te worden.

De gemeente zal in de programmabegroting 2019 de benodigde middelen opnemen. De samenwerkingsovereenkomst zal worden afgesloten onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van genoemde programmabegroting. Indien gemeenteraad niet akkoord gaat met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen treden partijen in overleg.

De samenwerkingsovereenkomst wordt onder voorbehoud van goedkeuring van het algemeen bestuur met het verstrekken van de benodigde middelen afgesloten. Indien het algemeen bestuur niet akkoord gaat met het beschikbaar stellen van de benodigde middelen treden partijen in overleg.

- 10.7 Bij de uitvoering van deze overeenkomst streven partijen naar een zo gunstig mogelijk fiscaal regime en verdeling van subsidies POP3 en GOB.
De gemeente houdt de BTW van het waterschapsdeel apart en dient deze niet in bij het BTW-compensatiefonds. Deze niet-verrekenbare BTW wordt ingediend bij POP3 en GOB.
- 10.8 In verband met de POP3 – subsidie brengt het waterschap zijn uren in via de declaratie bij RVO als zijnde kosten van het waterschap, dit zal niet via een declaratie aan de gemeente plaatsvinden.
De uren van Hultense Leij, Groote Leij en Dongevallei en van het GOB-gedeelte worden niet ingediend bij POP3-subsidie. De opgevoerde uren binnen het POP3 project hebben enkel betrekking op het POP3-deel van het project.

Artikel 11 Publiciteit

- 11.1 Partijen zijn over en weer verplicht om resultaten van hun samenwerking pas openbaar te maken nadat zij over de inhoud, de wijze en het tijdstip van de publicatie(s) schriftelijk overeenstemming hebben.
- 11.2 Partijen noemen in elke publicatie expliciet de samenwerking tussen partijen en de provincie als subsidieverlener naast andere subsidieverleners.

tum inwerkingtreding en duur van de overeenkomst

12.1 Deze samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op de datum waarop zij door partijen is ondertekend en eindigt in principe zodra de doelstellingen, zoals omschreven in artikel 2 gerealiseerd zijn en de financiële afwikkeling heeft plaatsgevonden, behoudens eerdere beëindiging als één van de partijen daar aanleiding toe ziet en daarover constructieve onderlinge afstemming heeft plaatsgevonden en partijen hier schriftelijk toe besloten hebben.

12.2 In afwijking van lid 1 kunnen partijen de overeenkomst met wederzijds goedvinden tussentijds eerder beëindigen, mits partijen daarover vooraf schriftelijk overeenstemming bereiken. Onderdeel van die overeenstemming dient te zijn dat partijen het eens zijn over de afwikkeling van de financiële gevolgen van de tussentijdse beëindiging m.n. over het mogelijke gevolg dat de gemeente schadevergoeding moet betalen aan aannemers en opdrachtnemers vanwege de voortijdige beëindiging van overeenkomsten die de gemeente met hen heeft gesloten.

Artikel 13 Wijzigingen

13.1 De inhoud van deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen vooraf over de inhoud en gevolgen van de wijziging schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

13.2 Indien door onvoorziene en/of buiten de invloedssfeer van partijen liggende omstandigheden, ongewijzigde instandhouding van deze overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van een of beide partijen kan worden gevergd, treden zij direct met elkaar in overleg met als doel om te komen tot een voor beide partijen acceptabele oplossing die past in de geest van de overeenkomst.

Artikel 14 Geschillen

14.1 Partijen verplichten zich om, indien zijn van mening verschillen over enig onderwerp van deze overeenkomst of een daarbij behorende bijlage, zich aantoonbaar in te spannen om het meningsverschil in goed (bestuurlijk) overleg op te lossen. Als dat niet lukt is sprake van een geschil

14.2 Alle geschillen die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen zullen ontstaan zullen aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank te Zeeland-West Brabant, zittingslocatie Breda.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepalingen

16.1 Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het college van burgemeester en wethouders of een ambtenaar aan wie mandaat is verleend om namens het college te besluiten, tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald.

- 16.2 Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van het Waterschap wordt verlangd, is het daartoe aangewezen orgaan het dagelijks bestuur van het Waterschap, tenzij bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald.
- 16.3 Het is een partij niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit deze samenwerkingsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.

Aldus overeengekomen en ondertekend
19 september 2018

Waterschap Brabantse Delta,

 J
Lid Dagelijks Bestuur waterschap Brabantse Delta

Gemeente Tilburg,

Namens deze,

 J J
wethouder Groen, Natuur en Landschap

Bijlage 1, Begroting POP3

Begrotings-post	Investering/ activiteit	Kosten-soort*	Omschrijving kosten ind. onderbouwing	Levensduur** (kosten derden)/ medewerker*** (loonkosten)	Lokaleheid	Tarief end BTW	Sub-locatieposities	Bedrag end BTW totaal in €	GOB (end BTW in €)	Tilburg (end BTW in €)	Waterschap	POP 3 (end BTW in €)	POP3 verrekende BTW (indien van toepassing)
Interne uren	Waterschap	projectmanager			270	€ 80		€ 21.600				21.600	
	Waterschap	senior projectleider			1010	€ 70		€ 70.700				70.700	
	Waterschap	specialist waterbeheer			322	€ 60		€ 19.320				19.320	
	Waterschap	adviseur watersysteem beheer			209	€ 65		€ 13.585				13.585	
	Waterschap	teamleider c			110	€ 50		€ 5.500				5.500	
	Waterschap	juridisch beleidsmed			10	€ 70		€ 700				700	
	Waterschap	adviseur grondzaken & vastgoed			10	€ 55		€ 550				550	
	Waterschap	senior beleidsadviseur			40	€ 70		€ 2.800				2.800	
	Waterschap	adviseur water- en emissiebeheer			90	€ 55		€ 4.950				4.950	
	Waterschap	senior plantebeter en vergoedingverleener			30	€ 50		€ 1.500				1.500	
	Waterschap	communicatie adviseur			120	€ 40		€ 4.800				4.800	
	Waterschap	financieel beleidsmedewerker			70	€ 60		€ 4.200				4.200	
	Tilburg	senior projectleider			1000	€ 112		€ 112.000				112.000	
	Tilburg	ecoloog			75	€ 99		€ 7.425				7.425	
	Tilburg	landschapsarchitect			50	€ 99		€ 4.950				4.950	
	Tilburg	Grandverwerker			25	€ 99		€ 2.475				2.475	
	Tilburg	toezichthouder		interne uren Tilburg	400	€ 94		€ 37.600				37.600	
Totaal Interne uren								€ 314.321	€ 0	€ 0	€ 0	€ 314.321	€ 0

Voorbereidingkosten													
	Waterschap			BTL				€ 3.847	€ 0	€ 0		€ 3.847	€ 801
	Tilburg			BTL				€ 21.900	€ 10.950	€ 6.570		€ 4.380	€ 0
Totaal Voorbereidingkosten								€ 25.747	€ 10.950	€ 6.570		€ 8.227	€ 801

Beekherstel		Advieskosten						€ 194.513	€ 0	€ 0		€ 194.513	€ 40.848
		Planvorming en bestek						€ 57.285					
		Onderzoeken						€ 125.685					
		Voorbereiding en begeleiding						€ 11.543					
		Grondvererving						€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
		Uitvoeringskosten						€ 690.450	€ 0	€ 0		€ 690.450	€ 144.995
		Grondwerken						€ 318.525					
		Vispassages, inrichting						€ 335.160					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 36.765					
		Uitvoeringskosten Waterschap boven plafond (Verrekend in verdeling € 100.000)						€ 100.000	€ 0	€ 0		€ 100.000	€ 21.000
		Grondwerken						€ 45.000					
		Vispassages						€ 45.000					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 10.000					
Totaal Beekherstel								€ 984.863	€ 0	€ 0	€ 0	€ 984.863	€ 206.842

Overinrichting robuust		Advieskosten						€ 102.010	€ 51.005	€ 30.603		€ 20.402	€ 4.284
	Oude teij Bredasebaan	Planvorming en bestek						€ 53.703					
		Onderzoeken						€ 38.979					
		Voorbereiding en begeleiding						€ 9.328					
		Grondvererving						€ 173.200	€ 86.100	€ 51.660		€ 34.440	€ 0
		Uitvoeringskosten						€ 147.250	€ 73.625	€ 44.375		€ 29.450	€ 6.184
		Grondwerken						€ 72.184					
		Inrichting						€ 50.100					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 24.566					
	Reeshofweide	Advieskosten						€ 199.814	€ 99.907	€ 59.944		€ 39.963	€ 8.392
		Planvorming en bestek						€ 125.215					
		Onderzoeken						€ 65.271					
		Voorbereiding en begeleiding						€ 9.328					
		Grondvererving						€ 356.700	€ 178.350	€ 107.010		€ 71.340	€ 0
		Uitvoeringskosten						€ 810.086	€ 405.033	€ 243.020		€ 162.013	€ 34.023
		Grondwerken						€ 390.525					
		Inrichting						€ 391.421					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 26.120					
		Uitvoeringskosten boven plafond Tilburg € 120.000 verrekend in verdeling, waterschap € 80.000						€ 400.000	€ 200.000	€ 120.000		€ 80.000	€ 16.800
		Grondwerken						€ 188.000					
		Inrichting						€ 188.000					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 24.000					
	Loofhaven	Advieskosten						€ 67.545	€ 0	€ 0		€ 67.545	€ 14.184
		Planvorming en bestek						€ 32.490					
		Onderzoeken						€ 28.215					
		Voorbereiding en begeleiding						€ 6.840					
		Grondvererving						€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0
		Uitvoeringskosten						€ 105.073	€ 0	€ 0		€ 105.073	€ 22.065
		Grondwerken						€ 57.880					
		Inrichting						€ 39.070					
		Archeologie, explosieven, enz						€ 8.123					
								€ 2.360.657	€ 1.094.020	€ 656.412		€ 410.225	€ 120.984
								€ 3.685.687	€ 1.104.970	€ 662.982	€ 0	€ 1.917.736	€ 313.584

ge 2 Begroting GOB

GLOBALE KOSTENRAMING
GEMEENTE TILBURG
EVZ'S
VERDELING KOSTEN

datum: 14-6-2016
projectnr.: 226096

	areaal pnb	extra areaal	verdeling totale projectkosten excl. kosten grondverwerving	kosten grondverwerving	totaal kosten	te ontvangen subsidie van subsidieabel	Totaal overblijvende kosten	Overblijvende kosten Gemeente	Overblijvende kosten Waterschap
	are	are				50%	100%	60%	40%
Groote Leij									
- Subsidieabel	313		95%	€ 452.480,80	€ 247.074,14	€ 700.155,00	€ 350.077,50		
- Niet subsidieabel		300	5%	€ 23.814,78	€ 277.392,10	€ 301.206,88			
Totaal				€ 476.295,64	€ 525.066,24	€ 1.001.361,88			
Overblijvende kosten					€ 301.206,88	€ 350.077,50	€ 651.284,38	€ 390.770,63	€ 260.513,75
Multensche Leij									
- Subsidieabel	619		90%	€ 330.235,80	€ 578.177,73	€ 908.413,54	€ 454.206,77		
- Niet subsidieabel		475	10%	€ 38.662,87	€ 477.206,68	€ 513.002,54			
Totaal				€ 368.928,67	€ 1.055.387,41	€ 1.422.316,08			
Overblijvende kosten					€ 513.002,54	€ 454.206,77	€ 968.109,31	€ 580.865,59	€ 387.243,73
Oude Leij									
- Subsidieabel	225		100%	€ 341.414,67	€ 139.065,55	€ 480.480,22	€ 240.240,11		
- Niet subsidieabel		0	0%	€ -	€ 0,50	€ 0,50			
Totaal				€ 341.414,67	€ 139.066,05	€ 480.480,72			
Overblijvende kosten					€ 0,50	€ 240.240,11	€ 240.240,81	€ 144.144,37	€ 96.096,24
Dongevallei									
- Subsidieabel	245		100%	€ 215.754,83	€ 3.570,43	€ 219.325,26	€ 109.662,63		
- Niet subsidieabel		0	0%	€ -	€ -	€ -			
Totaal				€ 215.754,83	€ 3.570,43	€ 219.325,26			
Overblijvende kosten					€ -	€ 109.662,63	€ 109.662,63	€ 65.797,58	€ 43.865,05
Reeshofweide									
- Subsidieabel	409		98%	€ 1.086.603,20	€ 191.062,72	€ 1.277.665,93	€ 638.832,98		
- Niet subsidieabel		247	2%	€ 22.175,58	€ 98.426,49	€ 120.602,07			
Totaal				€ 1.108.778,78	€ 289.489,22	€ 1.398.268,00			
Overblijvende kosten					€ 120.602,07	€ 638.832,98	€ 759.435,03	€ 455.661,82	€ 303.774,01
Totaal					€ 4.521.752	€ 1.793.020	€ 2.728.732	€ 1.637.239	€ 1.091.493

INFORMATIEOVERDRACHT

- areaal pnb: Dit areaal is aangeduid door de Provincie Noord Brabant als EVZ.
- extra areaal: Dit areaal is door het projectteam aan de EVZ toegevoegd.
- De verdeling van de totale projectkosten excl. grondverwerving is afgestemd op de kosten van de werkzaamheden die plaats vinden op het areaal dat is aangegeven door de provincie Noord Brabant. Dit betreft met name alle werkzaamheden die met graven van de watergang verbonden zijn zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Op het extra areaal worden vooral beplantingen aangebracht en een enkele poelen gegraven.
